


ENGAGEMENT VS RÉALISATIONS

Élément du carnet	Engagé (USP)	Réalisé (USP)	État
#1 — Gérer les comptes utilisateurs	8	0	En cours
#2 — Gérer les véhicules	5	5	Terminé
#3 — Gérer les rendez-vous	13	13	Terminé
#4 — Créer une demande de réparation	8	8	Terminé
Total	34	26	3 / 4

26 / 34 USP acceptés par le PO (76 %). Vitesse réalisée du Sprint 1 = 26 USP. #2/#3/#4 satisfont la Définition de Terminé (revue par les pairs (MR GitLab), tests unitaires back Django + front Vitest, contrôle d'accès par rôle, main au vert). **Issue #1 (comptes) reste En cours** : ses 13 h estimées sont consommées mais la fonctionnalité est incomplète → reportée et à finaliser en priorité au Sprint 2.

ÉTAT D'AVANCEMENT — SUNSET GRAPH (PORTÉE VS DURÉE)

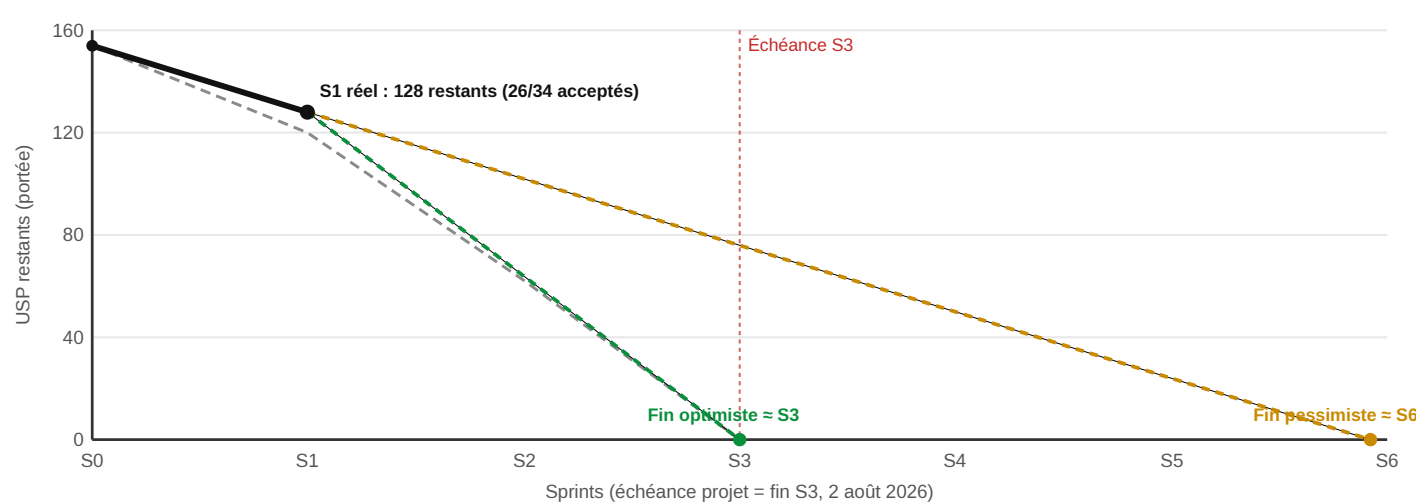

— Réel — Plan initial — Optimiste — 64 USP/sprint (plan + #1 reportée) — Pessimiste — 26 USP/sprint (réel S1)
Portée totale de l'équipe = 154 USP (18 issues) ; il en reste 128 après le Sprint 1. Le point réel est **au-dessus du plan** (écart dû à l'Issue #1, 8 USP, non terminée). Réponse aux deux questions : « quoi reste-t-il ? » → 128 USP (S2 : 58 + #1 reportée, S3 : 62) ; « quand ? » → fin S3 (2 août) si l'on porte la cadence à ~64 USP/sprint ; glissement vers **~S6** si la vitesse reste à celle du S1 (26 USP). Il faut donc **plus que doubler la vitesse** dès le S2 pour sécuriser l'échéance.

EFFORT & COÛTS — PRÉVUS VS RÉELS

Informations du jalon	Effort (h)	Coûts (\$)
Au début de l'itération ⁽¹⁾	68,0	7 480
Cette itération (Sprint 1)	52,0	5 720
Cumulatif à date	120,0	13 200
Estimation pour terminer ⁽²⁾	218,0	23 980
Total prévu ⁽³⁾	338,0	37 180
Budget initial ⁽⁴⁾	338,0	37 180
● Écart ⁽⁵⁾	0,0	0

Budget à l'équilibre (0 \$) selon les données consignées : les 52 h estimées du sprint sont consommées, R.A.F. aux estimations d'origine. **Réserve** : l'Issue #1 a épuisé ses 13 h sans être terminée — un **effort de finalisation non budgété** est à prévoir au S2 (risque d'écart futur). **Base budgétaire** : Liste d'activités (338 h / 37 180 \$ = Démarrage 38 + Planification 30 + Réalisation 230 + Clôture 40), qui raffine la capacité de la charte (275 h). ⁽¹⁾ cumul démarrage+planif · ⁽²⁾ R.A.F. · ⁽⁵⁾ Total prévu – Budget initial.

FAITS SAILLANTS

- ✓ **3/4 stories livrées** et acceptées (26/34 USP) : véhicules, rendez-vous, demande de réparation — **DoD respectée**.
- ✗ **Issue #1 (comptes utilisateurs) non terminée** malgré la consommation de ses 13 h estimées → reportée au S2, risque de rework/effort additionnel non budgété.
- ▲ Deux **obstacles techniques** (merge sur settings.py/urls.py, Node.js/Vite) rencontrés et **résolus dans le sprint**. Vitesse S1 = 26 USP ; viser **~64 USP/sprint** pour tenir le 2 août.

ÉTAT DE LA QUALITÉ

- Principal écart qualité** : l'Issue #1 (comptes utilisateurs) **ne satisfait pas encore la DoD** — fonctionnalité incomplète, non démontrable, reportée au S2.
- Les 3 autres passent la **DoD** : tests unitaires back+front verts, contrôle d'accès par rôle, transitions d'état (rendez-vous, demande), pipeline **main** au vert. **Aucun bogue ouvert** distinct au carnet.
- Les 2 items du carnet d'obstacles sont des enjeux de **processus** (fusion, environnement), résolus ; **impact nul** sur les 3 livrables acceptés.

RISQUES & OBSTACLES (RÉSUMÉ DIRECTION)

- Risque matérialisé (Ouvert) : R3 « Mauvaise estimation »** — comptes utilisateurs sous-estimés (13 h épuisées, fonctionnalité incomplète).
- Risques modifiés : R2 « Conflits de merge »** → **En traitement** (mitigé : 1 branche/issue) ; R5 « Incompatibilité des modèles (FK) » → **Fermé**. R1 & R4 inchangés (Ouverts). **Aucun nouveau risque**.
- Obstacles : O1 conflits de merge** — **Résolu** ; O2 Node.js incompatible (→ Node 24 LTS) — **Résolu**. **Aucun obstacle ouvert**.

PLAN D'AMÉLIORATION (DÈS LE SPRINT 2)

- 1. Finaliser l'Issue #1** (comptes utilisateurs) en priorité dès l'ouverture du S2 et re-estimer son reste à faire (rework non budgété).
- 2. Fiabiliser les estimations** (découpage plus fin, marge de rework) et éliminer les conflits de fusion : 1 branche/issue, propriétaire des fichiers partagés, petites MR fréquentes.
- 3. Démarrer les stories en parallèle** dès le jour 1 pour porter la vitesse de 26 à ~64 USP/sprint et sécuriser l'échéance.
