


ENGAGEMENT VS RÉALISATIONS

Élément du carnet	Engagé (USP)	Réalisé (USP)	État
#5 — Consulter l'état des réparations	8	8	Terminé
#6 — Gérer les diagnostics	13	13	Terminé
#7 — Gérer les interventions mécaniques	13	13	Terminé
#8 — Gérer les utilisateurs et rôles	8	0	En cours
#9 — Gérer les types de réparations	8	8	Terminé
#10 — Affecter les réparations aux mécaniciens	8	0	En cours
Total	58	42	4 / 6

42 / 58 USP acceptés par le PO (72 %). Vitesse S2 = 42 USP (vs 26 au S1). Les 4 stories livrées satisfont la DoD (revue par les pairs, tests back Django + front Vitest, contrôle d'accès par rôle, transitions d'état, main au vert). 3 stories restent En cours : #8, #10 et #1 (comptes, reporté du S1), non terminé sur 2 sprints → à finaliser en priorité au S3.

ÉTAT D'AVANCEMENT — SUNSET GRAPH (PORTÉE VS DURÉE)

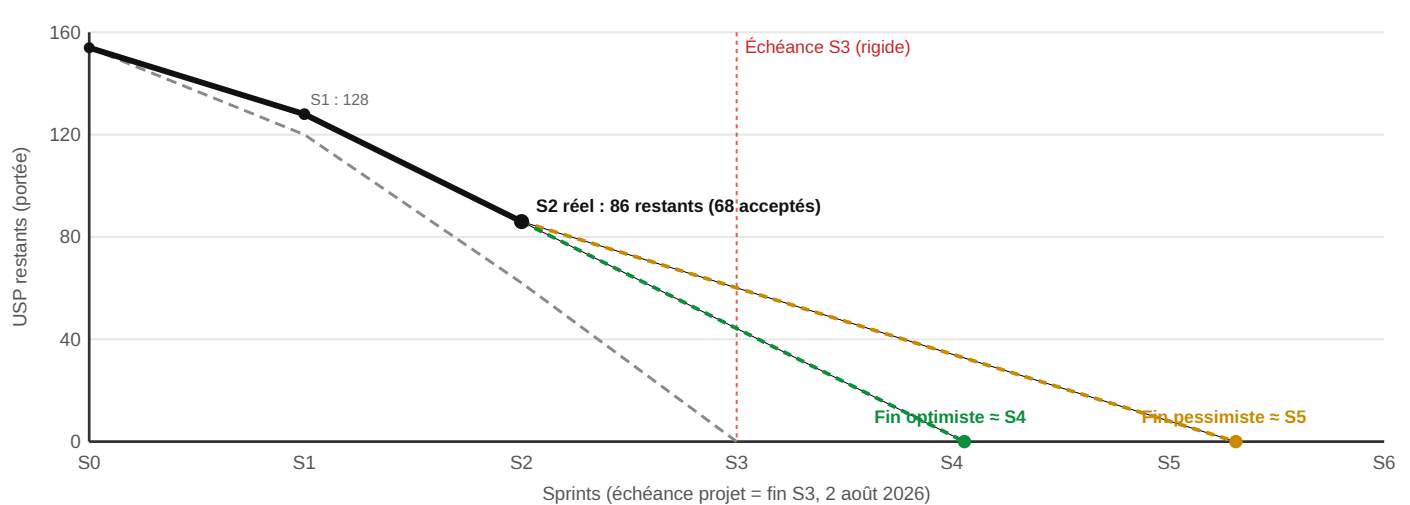

— Réel — Plan initial — Optimiste — 42 USP/sprint (vitesse S2) — Pessimiste — 26 USP/sprint (vitesse S1)
Portée totale = 154 USP ; il en reste 86 après le Sprint 2 (68 acceptés). Vitesse en hausse (26 → 42). Réponse aux deux questions : « quoi reste-t-il ? » → 86 USP, dont 24 en cours (#1, #8, #10) et 62 non commencés (#11-#18) ; « quand ? » → fin ~S4 à la vitesse S2, ~S5 à celle du S1 — les deux dépassent l'échéance S3. L'échéancier étant rigide, la portée doit être réduite d'environ 44 USP (voir plan d'amélioration).

EFFORT & COÛTS — PRÉVUS VS RÉELS

Informations du jalon	Effort (h)	Coûts (\$)
Au début de l'itération ⁽¹⁾	120,0	13 200
Cette itération (Sprint 2)	75,0	8 250
Cumulatif à date	195,0	21 450
Estimation pour terminer ⁽²⁾	143,0	15 730
Total prévu ⁽³⁾	338,0	37 180
Budget initial ⁽⁴⁾	338,0	37 180
● Écart ⁽⁵⁾	0,0	0

Budget à l'équilibre (0 \$) selon les données consignées (R.A.F. aux estimations d'origine). Réserve : Issue #9 livrée en léger dépassement (+2 h / +220 \$) et les 3 stories En cours consomment de l'effort sans être acceptées → finalisation possiblement non budgétée au S3. Base budgétaire : Liste d'activités 338 h / 37 180 \$. ⁽¹⁾ démarrage+planif+S1. ⁽²⁾ R.A.F. ⁽⁵⁾ Total prévu – Budget initial.

FAITS SAILLANTS

- ✓ Vitesse en hausse : 42 USP acceptés (vs 26 au S1). 4/6 stories livrées (état des réparations, diagnostics, interventions, types de réparations), dans les délais (souvent en avance) et conformes à la DoD.
- ▲ Sur-engagement / WIP élevé : 3 stories restent En cours — #8 (rôles), #10 (affectations) et #1 (comptes, non terminé sur 2 sprints) = 24 USP non acceptés.
- ✗ Portée restante 86 USP pour un seul sprint planifié (S3) : échéance du 2 août rigide → il faut retirer ~44 USP de la portée (décision PO).

ÉTAT DE LA QUALITÉ

- Les 4 stories livrées passent la DoD : tests unitaires back+front verts, contrôle d'accès par rôle, transitions d'état (diagnostics, interventions). Aucun bogue ouvert distinct au carnet.
- Écarts qualité : #1, #8 et #10 (En cours) ne satisfont pas encore la DoD — incomplètes, non démontrables, reportées au S3.
- Issue #9 livrée mais avec un dépassement d'effort de 2 h (estimation trop basse) — pas un défaut fonctionnel.

RISQUES & OBSTACLES (RÉSUMÉ DIRECTION)

- Risque fermé : R2 « Conflits de merge » → Fermé (mitigation efficace : 1 branche/issue, coordination Discord).
- Risques matérialisés (Ouverts) : R3 « Mauvaise estimation » (#9 dépassé, 3 stories en cours) ; R4 « Problèmes techniques » (migration Django, dépendance manquante). R1 & R5 inchangés. Aucun nouveau risque.
- Obstacles nouveaux (résolus) : O3 migration Django incompatible (AUTH_USER_MODEL → recréation de la base) ; O4 module django-filter manquant (pip install). Aucun obstacle ouvert.

PLAN D'AMÉLIORATION (DÈS LE SPRINT 3)

- 1. Limiter le WIP : finir les stories en cours (#1, #8, #10) avant d'en démarrer de nouvelles (« finir avant de commencer »).
- 2. Décision de portée (PO) : échéance fixe (2 août) → retirer les « Souhaitable » #16-#18 (26 USP) et renégocier les « Important » de moindre priorité (~18 USP) pour ramener la portée à la capacité d'un sprint.
- 3. Verrouiller l'environnement : dépendances (django-filter), migrations et versions documentées et vérifiées pour éliminer les blocages techniques récurrents.
